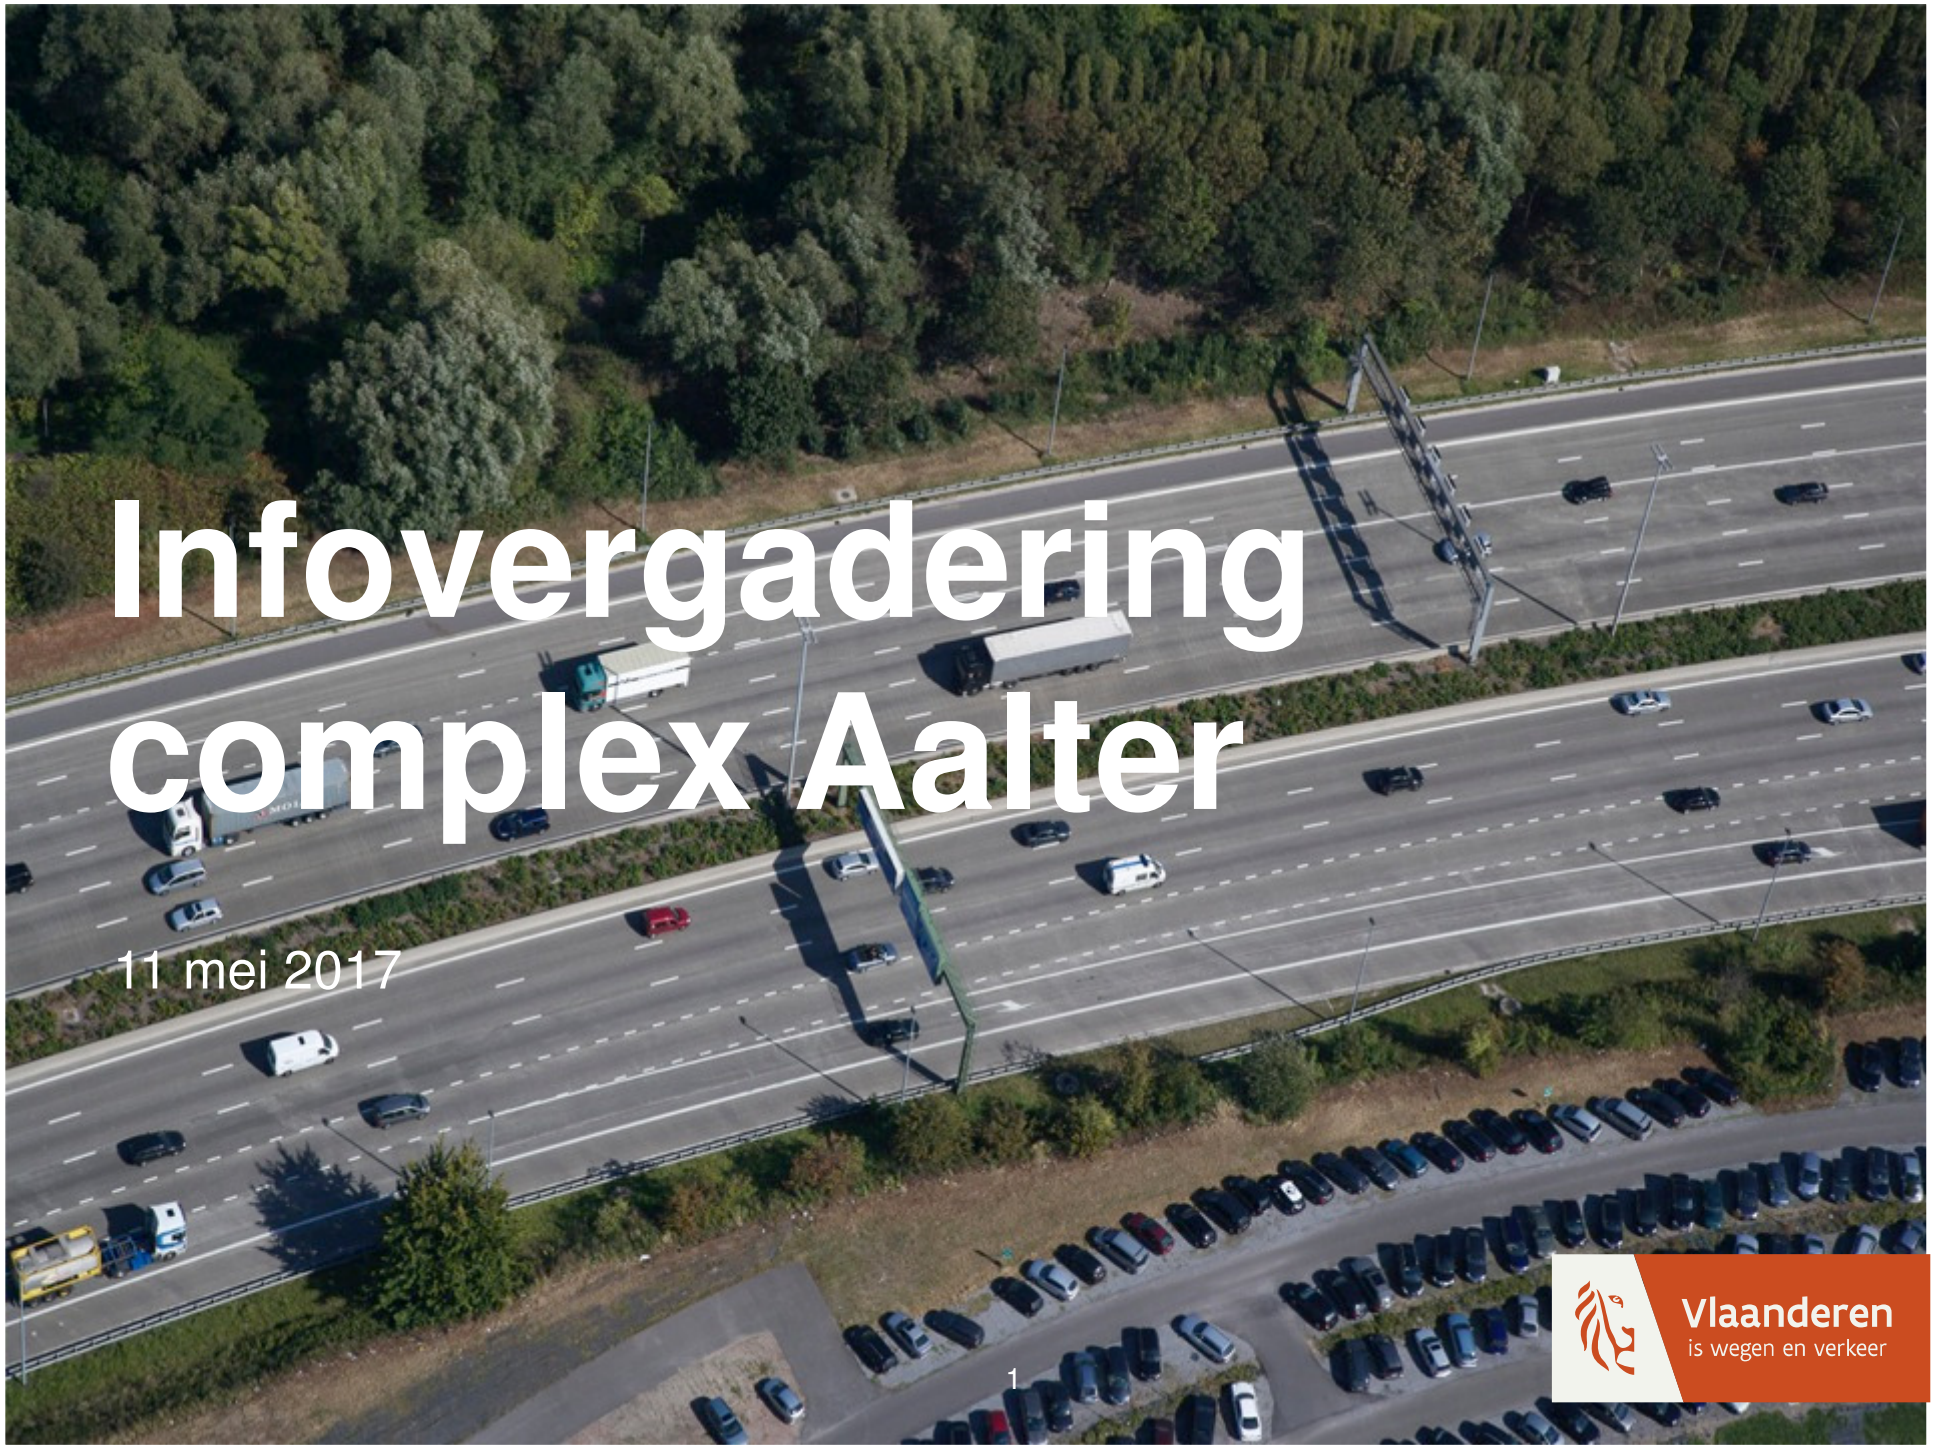

Infovergadering complex Aalter

11 mei 2017

Vlaanderen
is wegen en verkeer

Welkom

Patrick Hoste
Wnd burgemeester Aalter

Vlaanderen
is wegen en verkeer

Heraanleg complex Aalter

Sylvie Syryn
Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen

Vlaanderen
is wegen en verkeer

Van oud naar nieuw
Wat wijzigt?

Bestaande situatie

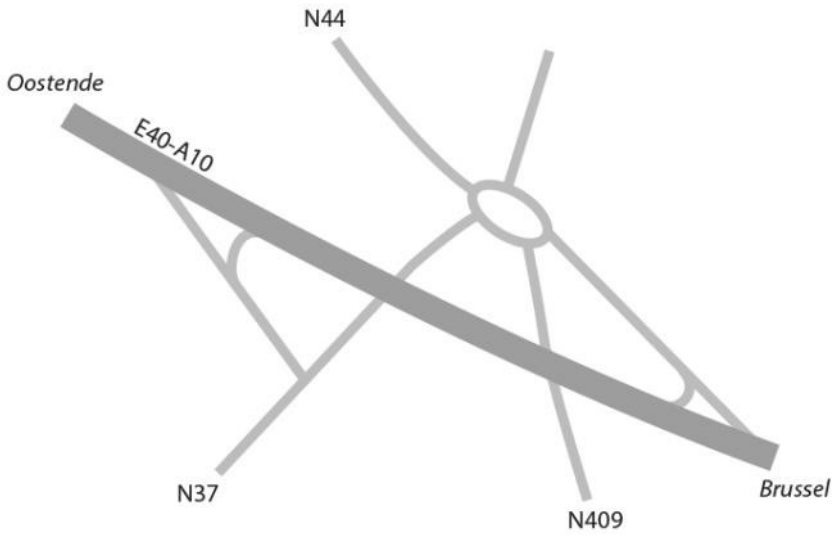

Toekomst

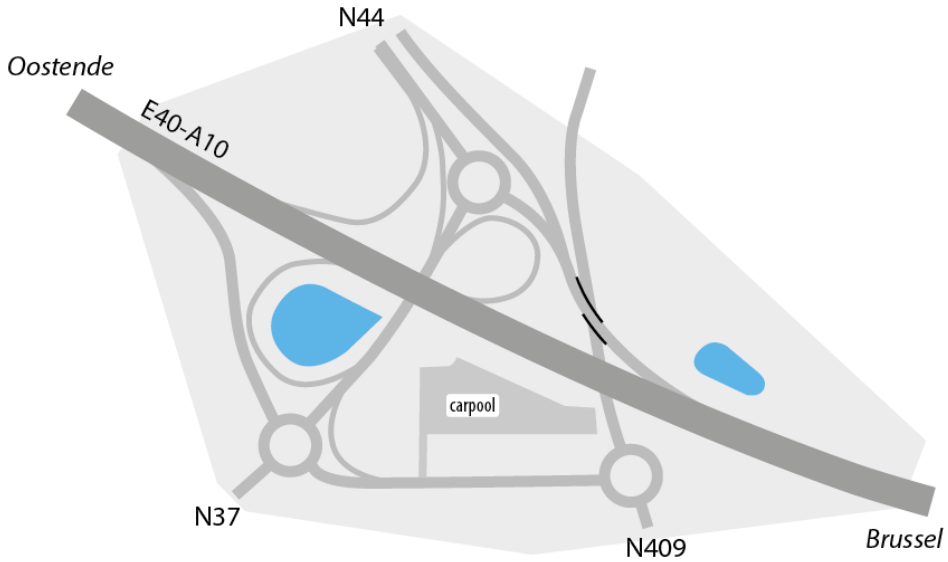

Vlaanderen
is wegen en verkeer

Overzicht

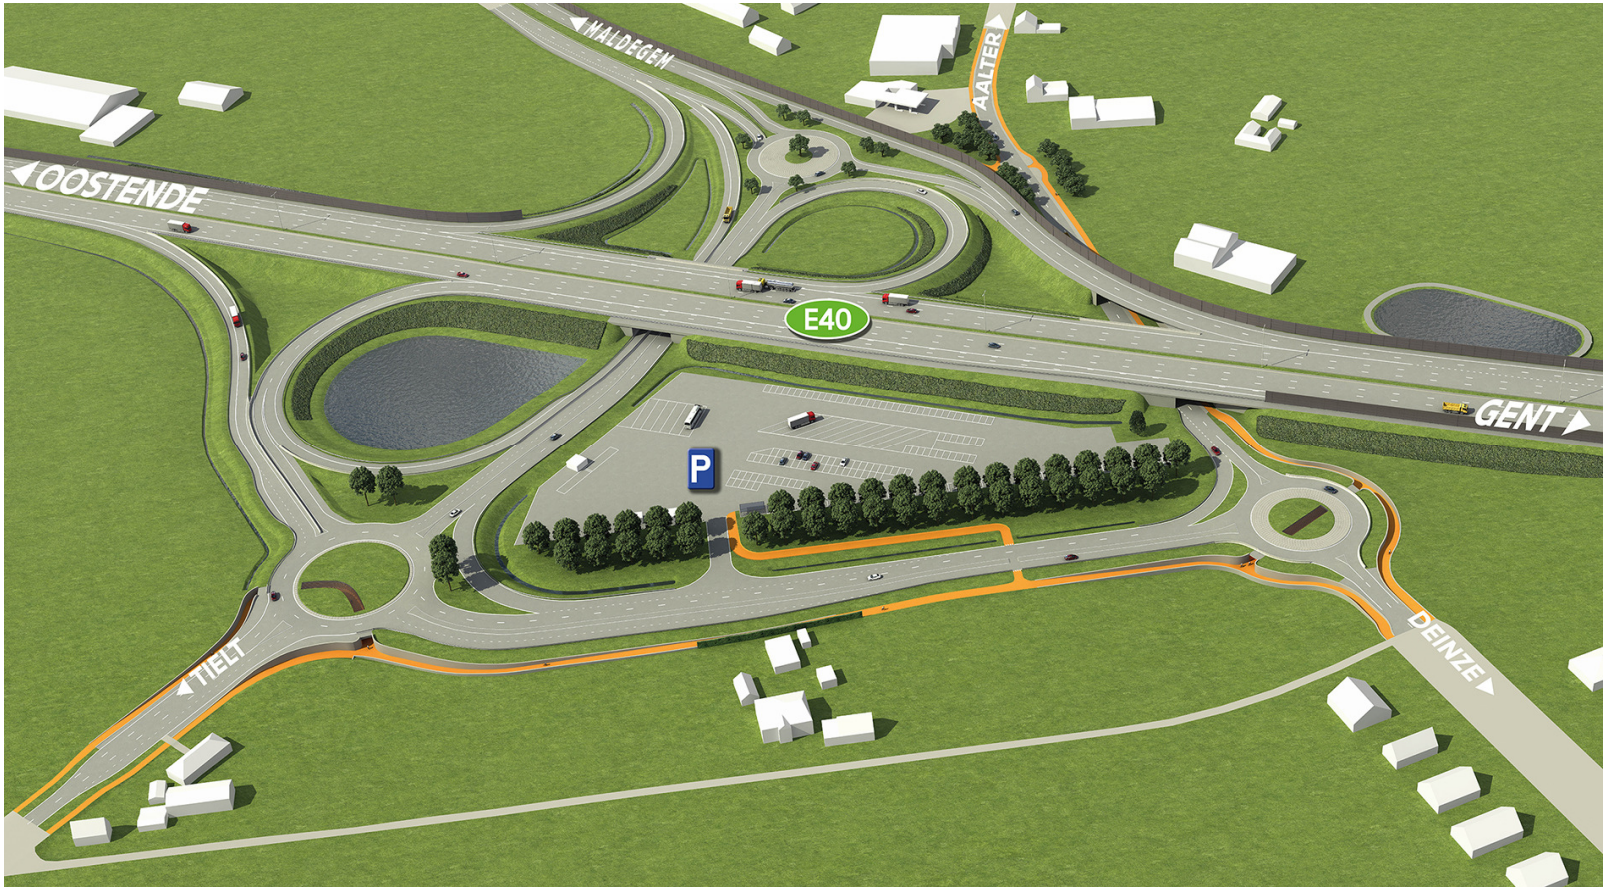

Vlaanderen
is wegen en verkeer

Zicht richting Knokkeweg

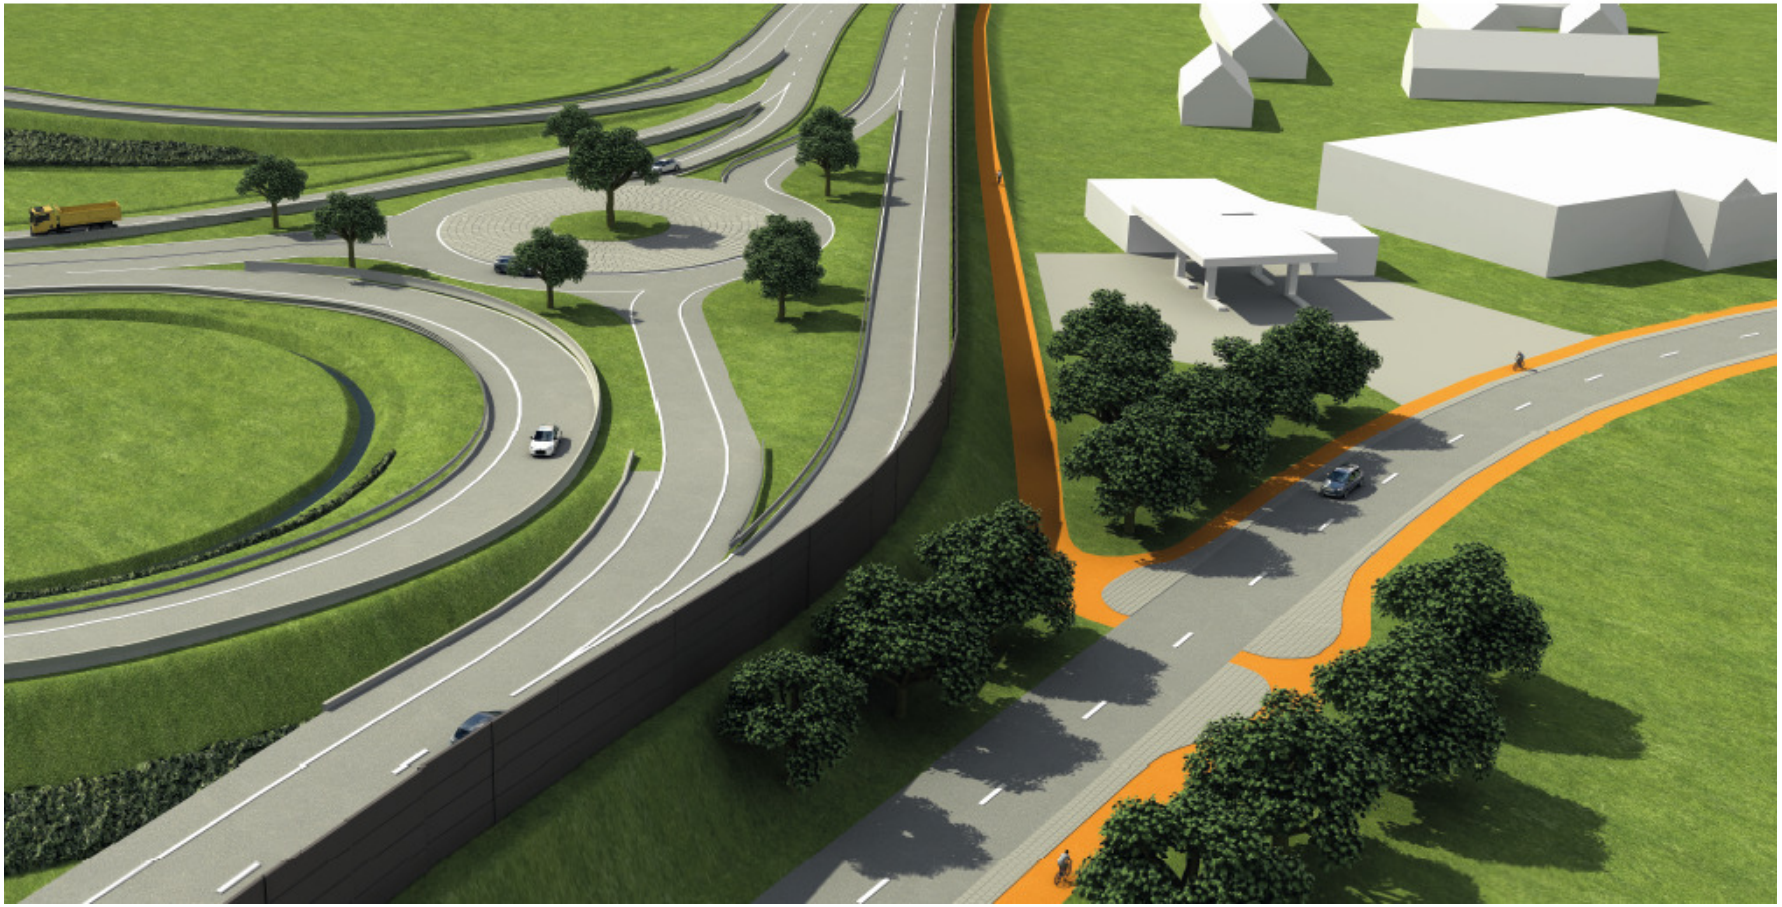

Vlaanderen
is wegen en verkeer

Overzicht

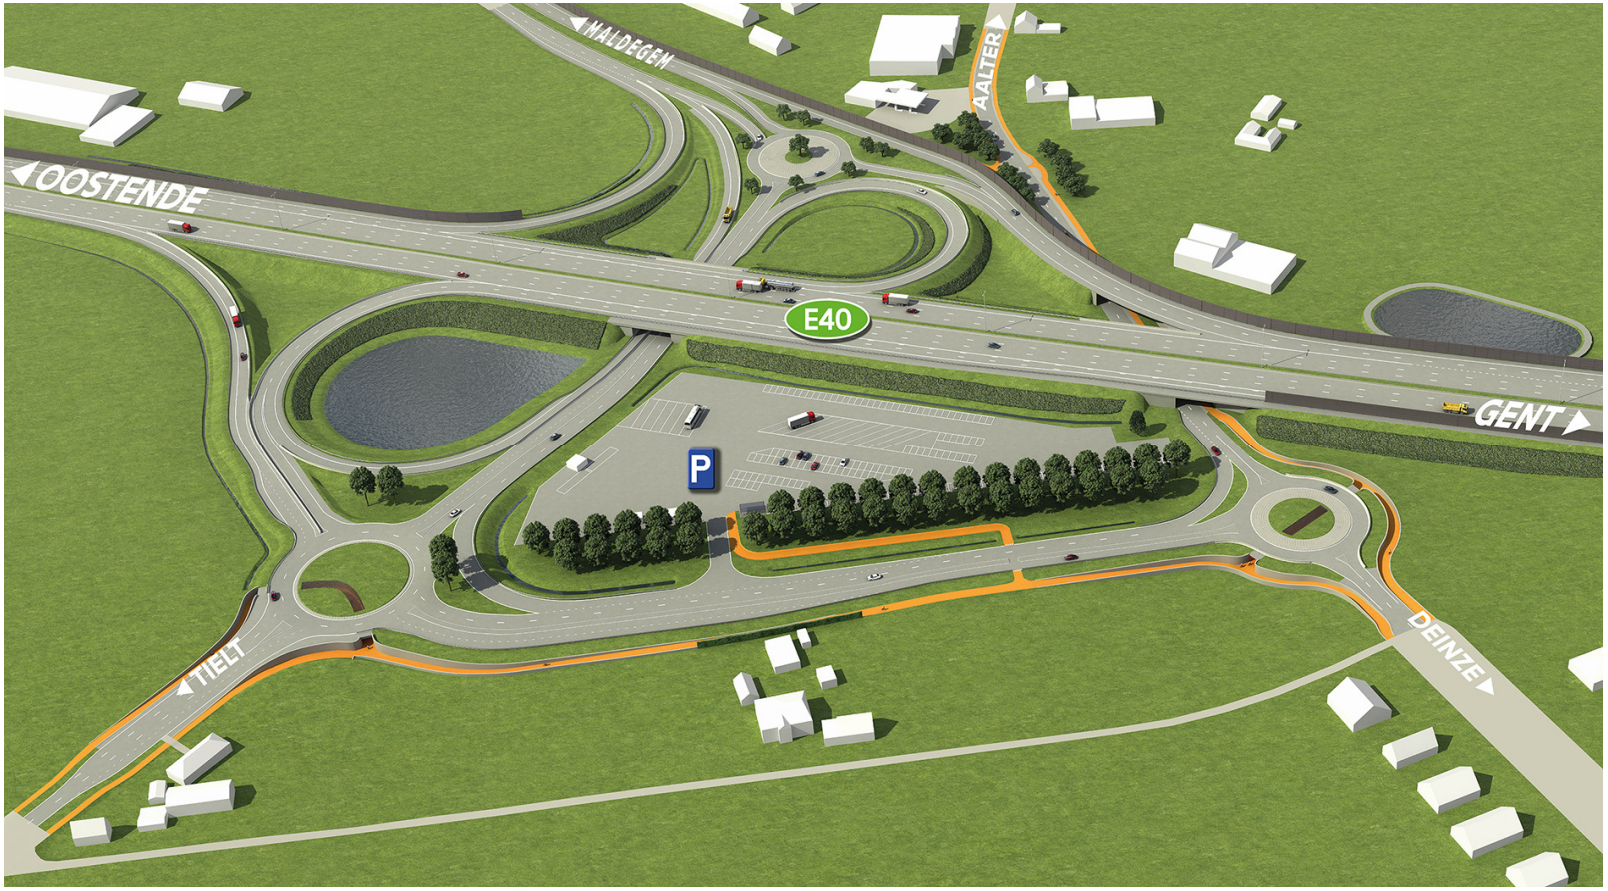

Vlaanderen
is wegen en verkeer

Geluidsschermen

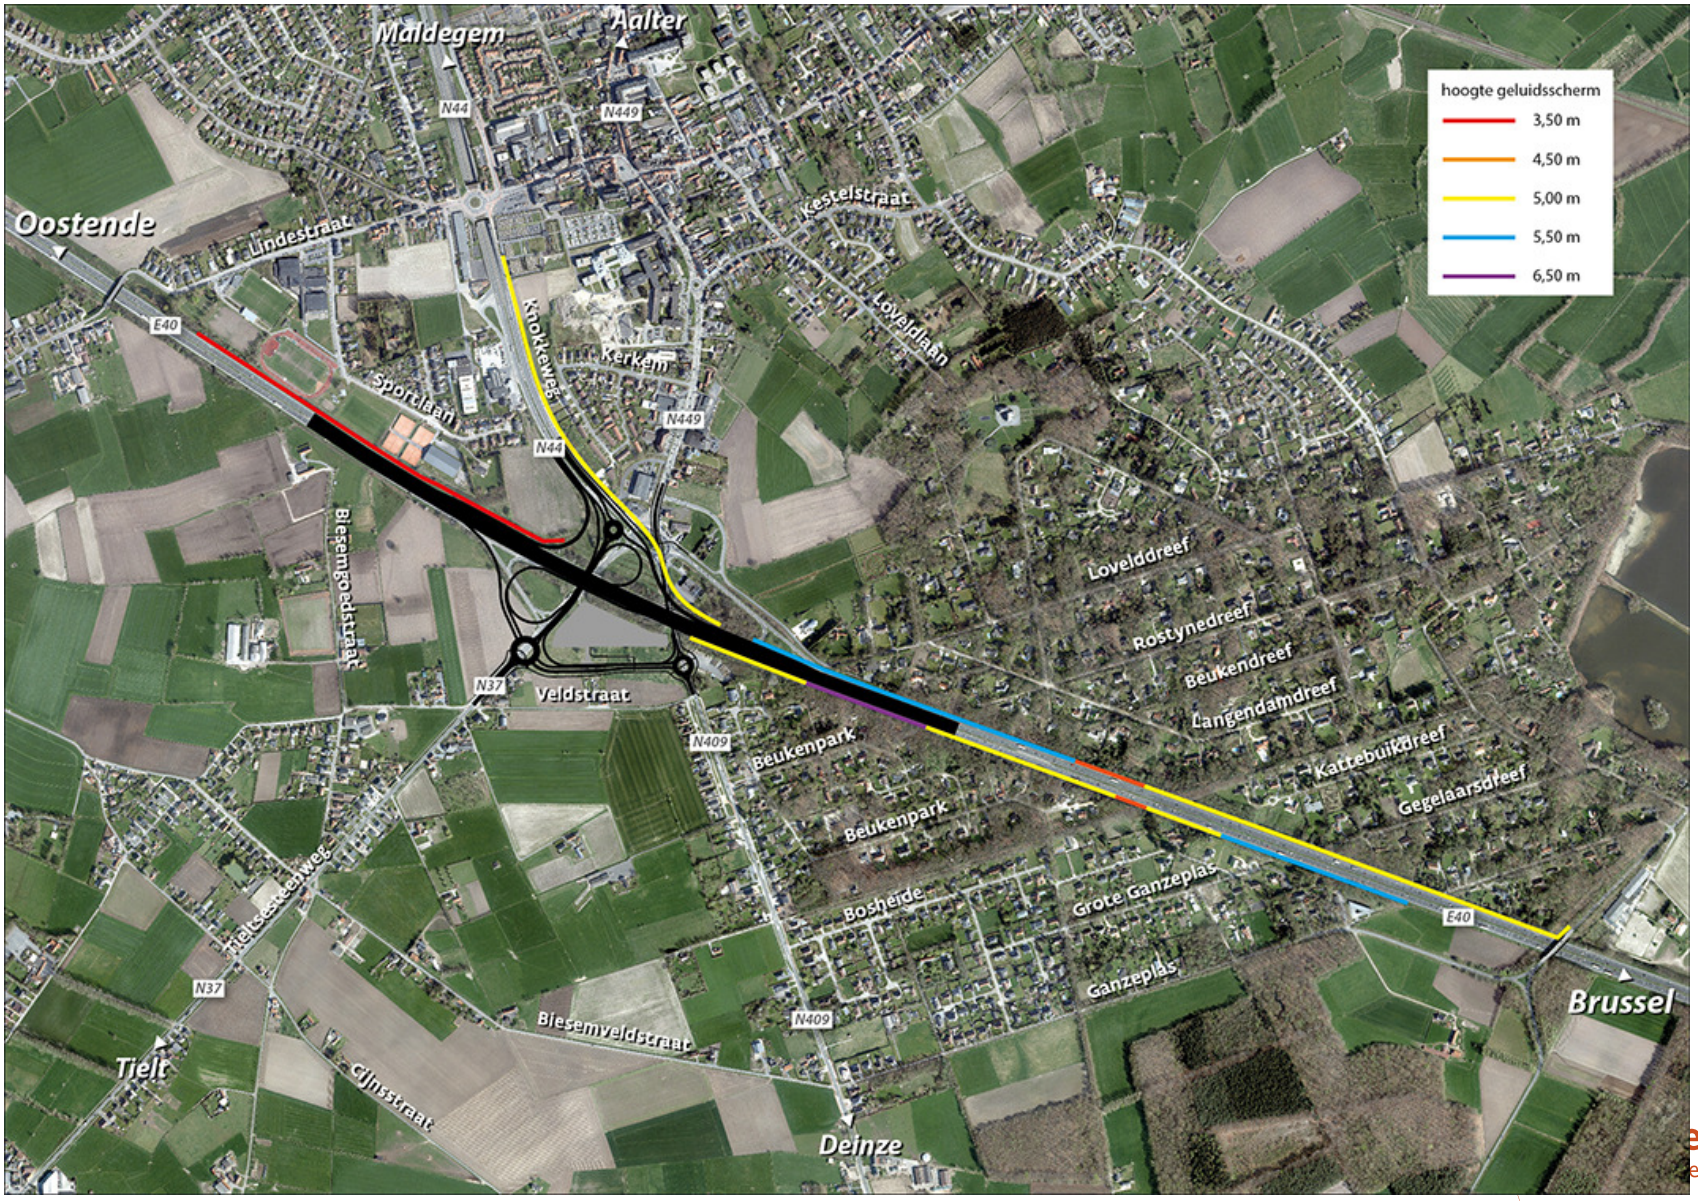

Stand van zaken

- De werken:
  - 3 nieuwe rotondes: 2 afgewerkt
  - Vier nieuwe bruggen in de E40: 1 bijna klaar (juni)
  - Nieuwe op- en afritten, waaronder 1 fly-over: op- en afrit richting Gent klaar, oprit richting Oostende in aanbouw
  - Twee fietstunnels: afgewerkt
  - Een nieuwe carpoolparking
  - 2 bufferbekkens
- Timing:
  - 1 jaar en 2,5 maanden bezig
  - Nog kleine 2 jaar te gaan

Vlaanderen
is wegen en verkeer

Grote lijnen fasering komende maanden

- Begin juni ’17 - half november ‘17
  - Tieltsesteenweg afgesloten aan brug
  - Knokkeweg (N44): één rijstrook in **beide** richtingen

- Half november ’17 – voorjaar ’18
  - Tieltsesteenweg afgesloten aan brug
  - Knokkeweg (N44): één rijstrook in **beide** richtingen
  - Wissel op E40: oprit richting Oostende afgesloten

Begin juni tot half november 2017

Wat?

- Noordzijde van de E40: nieuwe rotonde + alle aansluitingen
- E40: nieuwe brug E40 over de Tieltsesteenweg

Hoe rijdt het verkeer?

- E40 richting Brussel via de tijdelijke parallelweg
- E40 richting kust: normale rijstroken
- Tieltsesteenweg onderbroken aan brug: omleiding via verbindingsweg en rotonde aan Steenweg op Deinze (N409)
- N44 (Knokkeweg):
  - beide richtingen slechts 1 rijstrook
  - Rechtstreekse oprit naar E40 richting kust is af en in gebruik

Vlaanderen
is wegen en verkeer

Begin juni tot half november 2017

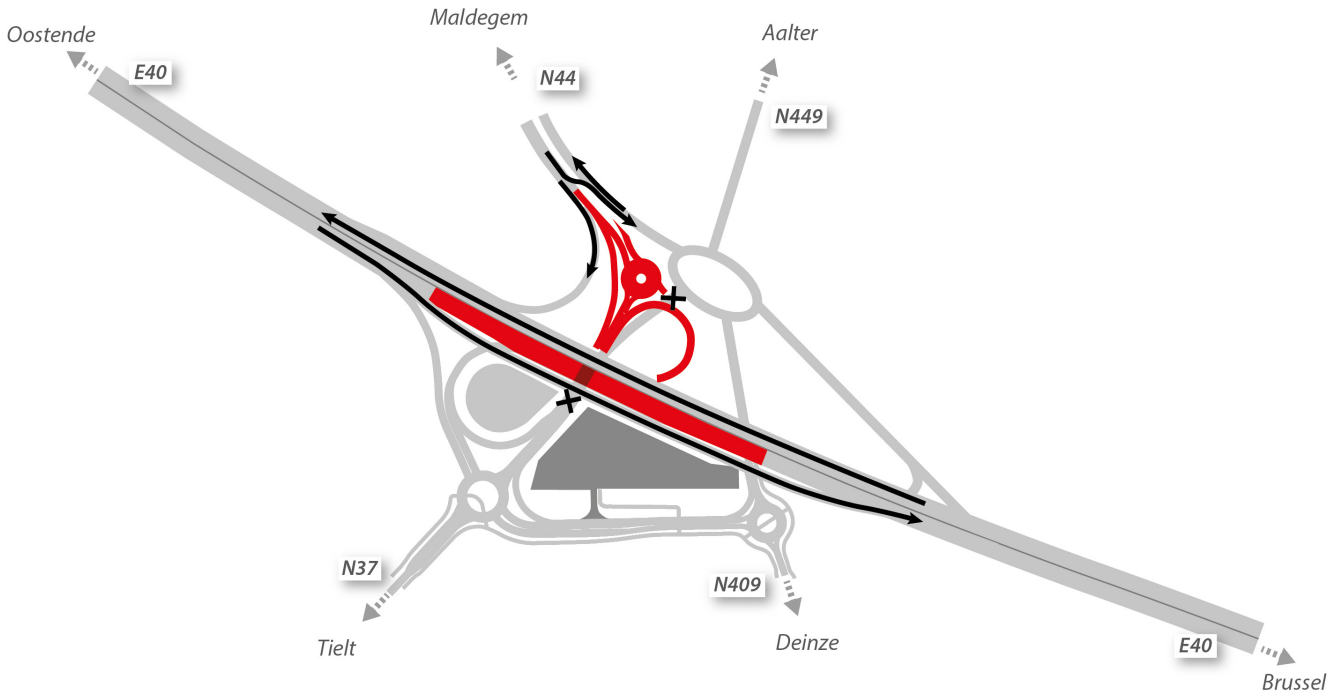

Vlaanderen
is wegen en verkeer

Begin juni tot half november 2017

Hoe rijden de fietsers?

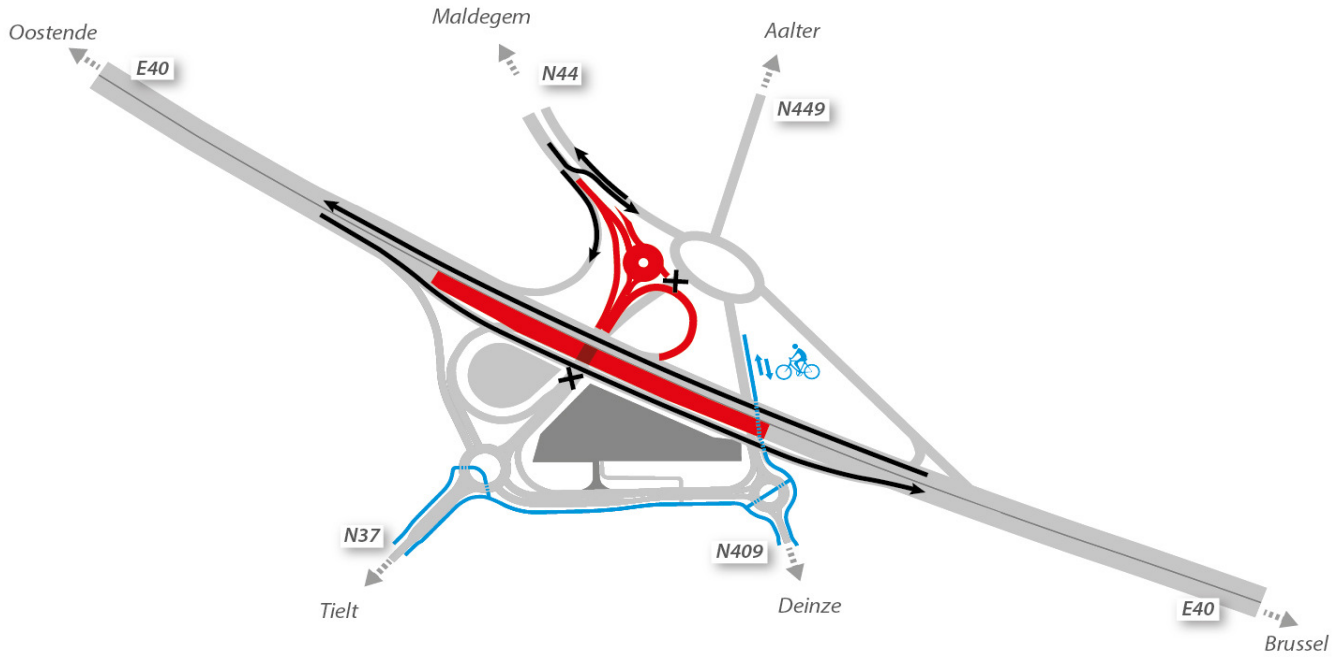

Vlaanderen
is wegen en verkeer

Half november 2017 tot april 2018

Wat?

- Noordzijde van de E40: aansluiting N44 op nieuwe rotonde
- E40: nieuwe brug E40 over de Tieltsesteenweg

Hoe rijdt het autoverkeer?

- E40 richting Brussel via de tijdelijke parallelweg
- E40 richting kust:
  - via doorsteek naar andere rijrichting
  - Oprit E40 richting kust afgesloten: omleiding via Nevele
- Tieltsesteenweg onderbroken aan brug: omleiding via verbindingsweg en rotonde aan Steenweg op Deinze (N409)
- N44 (Knokkeweg):
  - beide richtingen slechts 1 rijstrook
  - Verbinding van oude rotonde naar N44 steeds mogelijk

Vlaanderen
is wegen en verkeer

Half november 2017 tot april 2018

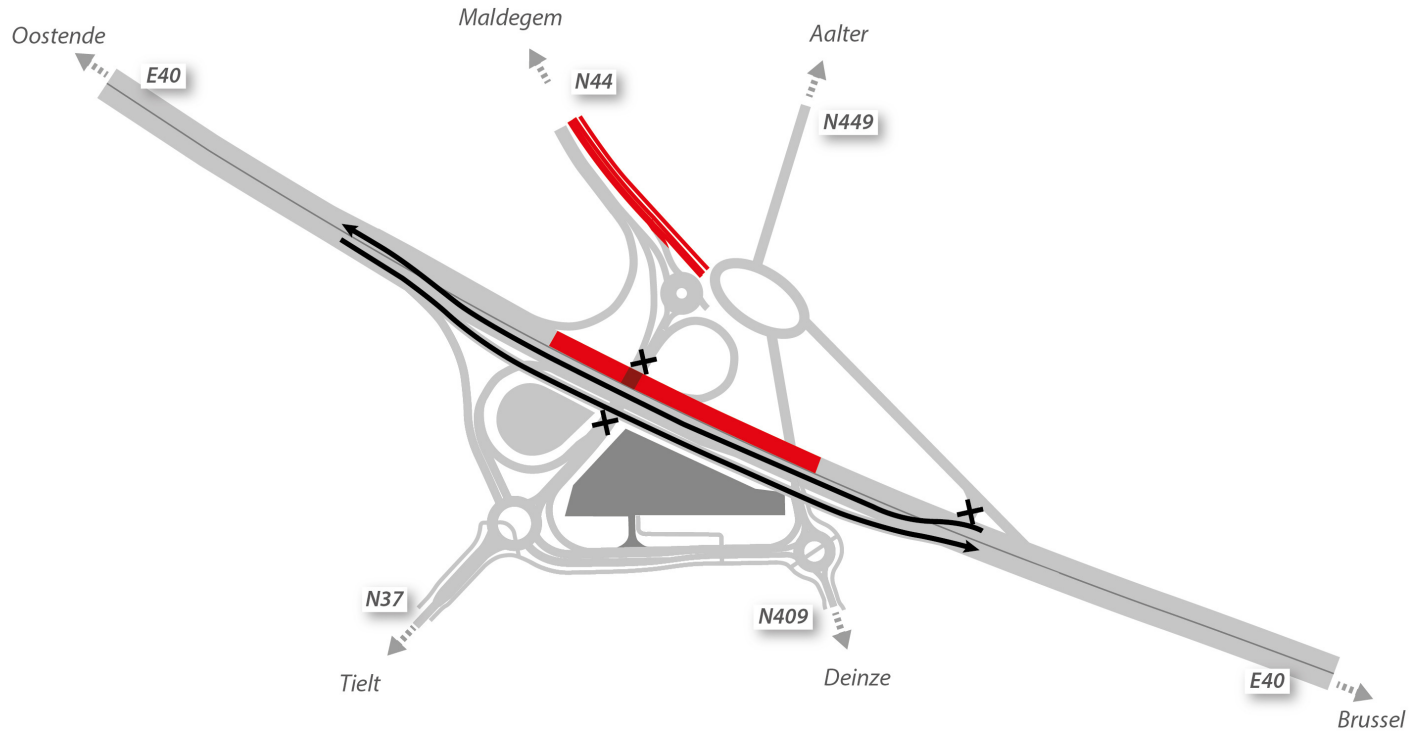

Vlaanderen
is wegen en verkeer

Half november 2017 tot april 2018

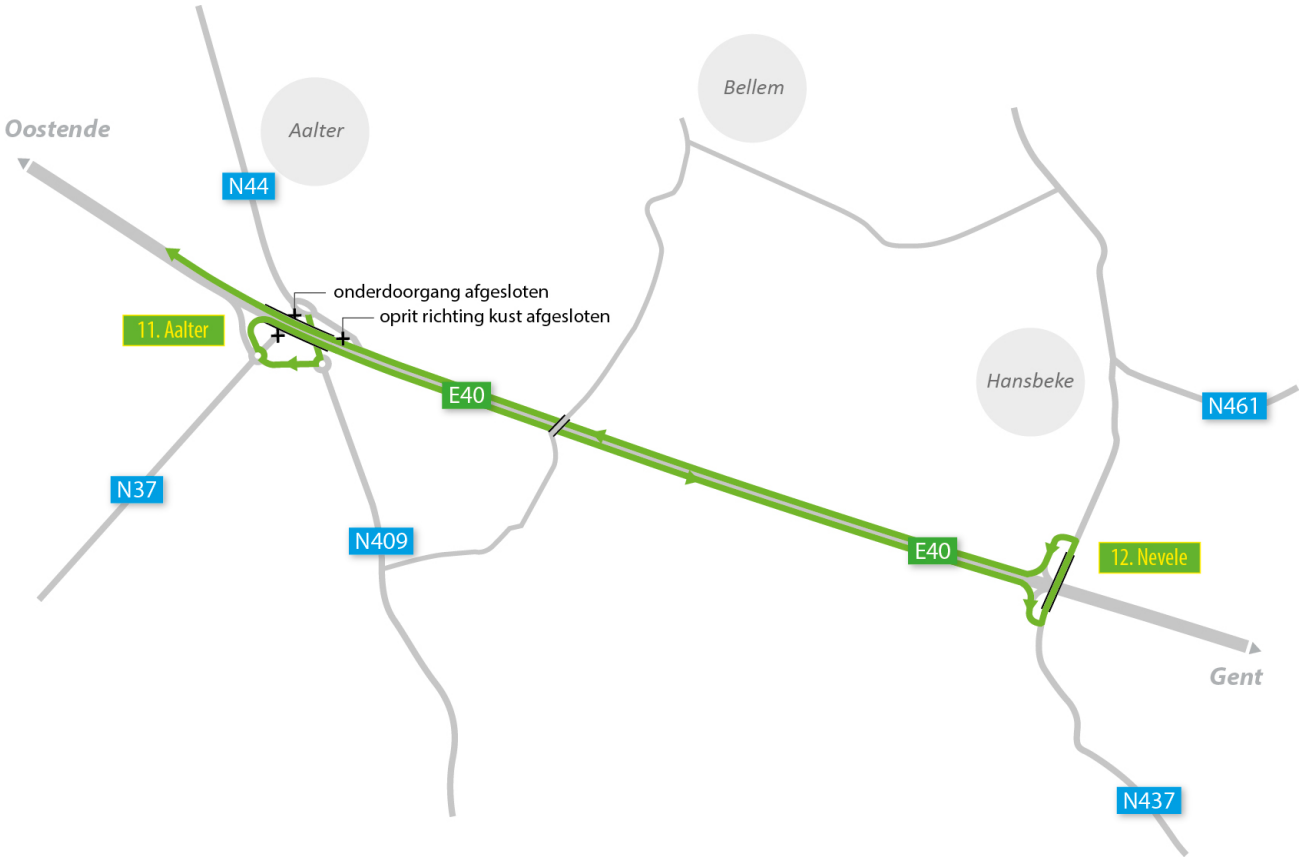

Vlaanderen
is wegen en verkeer

Werken na april 2018

April 2018 tot voorjaar 2019

- Fly-over van E40 naar N44
- Bouw laatste brug over Steenweg op Deinze
- Heraanleg E40
- Aanleg carpoolparking en bufferbekkens

Aansluitend op de werken (wellicht voorjaar 2019)

- geluidsschermen

Vlaanderen
is wegen en verkeer

Overzicht

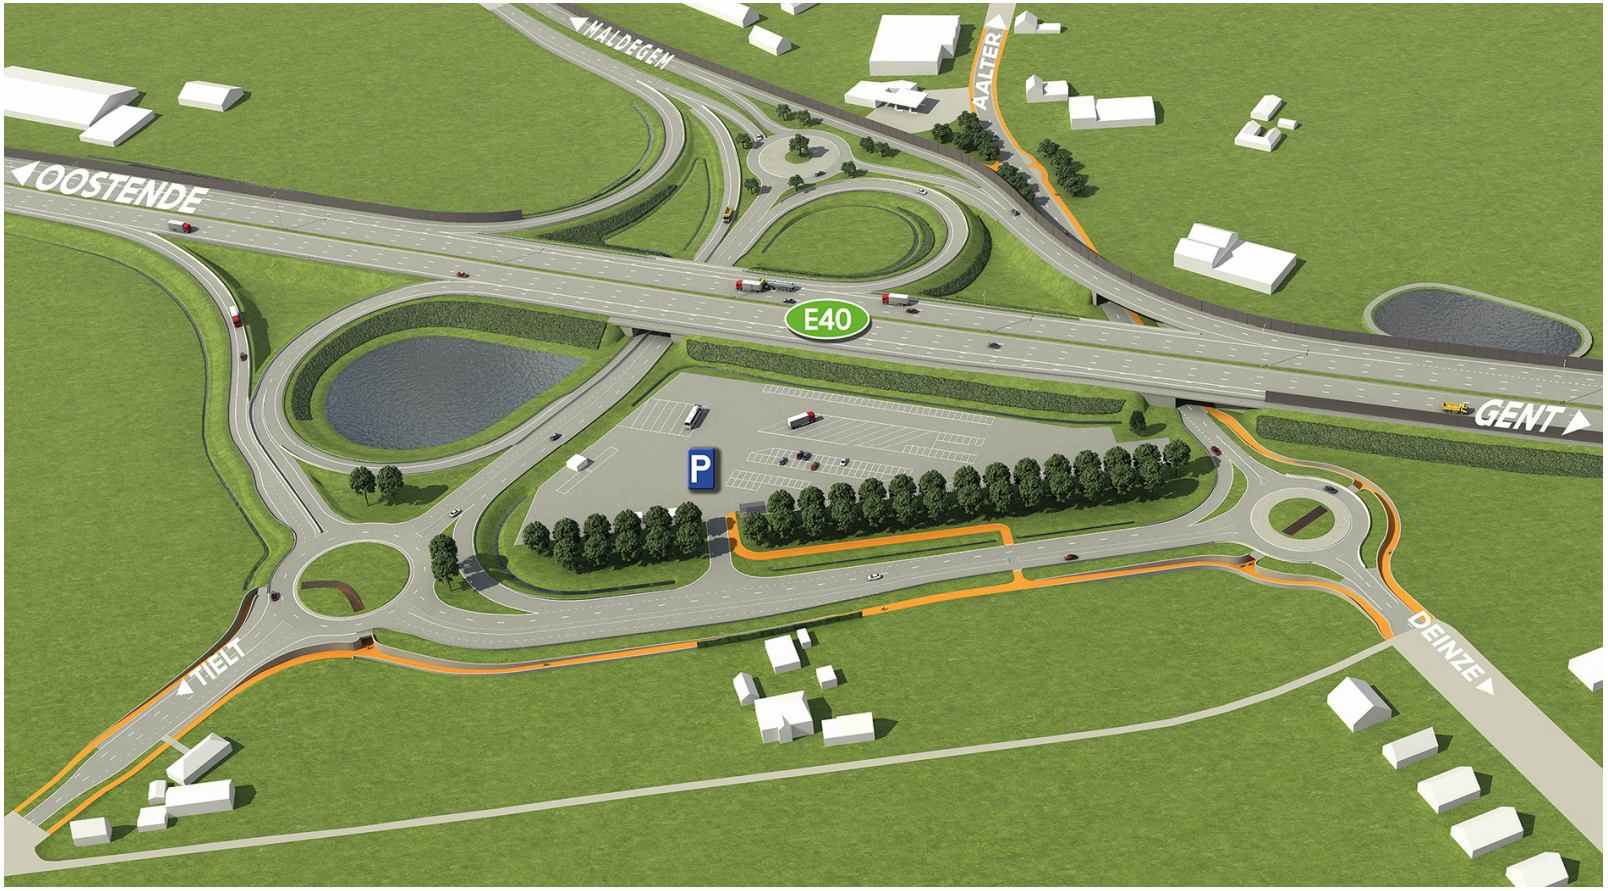

Vlaanderen
is wegen en verkeer

Minder hinder

- Goed uitgekiende fasen om hinder zo veel mogelijk te beperken
- Tijdelijke parallelweg langs E40
- Verbinding tussen beide zijden E40 (N-Z) blijft steeds mogelijk
  - ofwel via N37
  - ofwel via N409
- Veilige fietsverbinding altijd gegarandeerd
- Goede communicatie

Communicatie

- Infovergaderingen
- Bewonersbrieven
- Webpagina:
  - www.wegenenverkeer.be/Aalter
- Digitale nieuwsbrief
- Borden langs E40 /N44
- Perscommunicatie
- Vragen via
  - wegen.oostvlaanderen@vlaanderen.be
  - 09 276 26 00

Vlaanderen
is wegen en verkeer

Vlaanderen
is wegen en verkeer
